

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS**

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



42º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 01 do 10 de 2015, às 08 horas e 45 minutos.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.
- Jonas Meneses Knebel, encarregado.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA (Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 01, do mês de Outubro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, realizou o acompanhamento das atividades de escavação, compactação e aplicação de ICM - 30, para reposição asfáltica e cortes nos asfaltos e assentamento de rede 200mm de FoFo e rede de 50mm, nos seguintes trechos percorridos.

- Avenida Paraná sentido a Rua Theobrama, sequenciamento da escavação e implantação de rede de distribuição de água com tubos de 200mm de FoFo e rede de 50mm de PVC – PBA.
- Avenida Monte Negro sentido a Rua Nova União, sequenciamento de assentamento de rede de distribuição de água com tubos de 50mm de PVC – PBA.
- Avenida Monte Negro sentido a Avenida Rondônia, sequenciamento das atividade com aplicação de ICM -30, e assentamento da massa asfáltica.

Para a frente de obra do dia 01 do 10 de 2015, foram disponibilizado 4 frente de serviços com atividades de preparação dos trechos escavados para recuperação asfáltica, e realização dos cortes no asfalto para escavação e assentamento de rede de 200mm de FoFo e de 50mm de PVC – PBA.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-42º Relatório fotográfico.

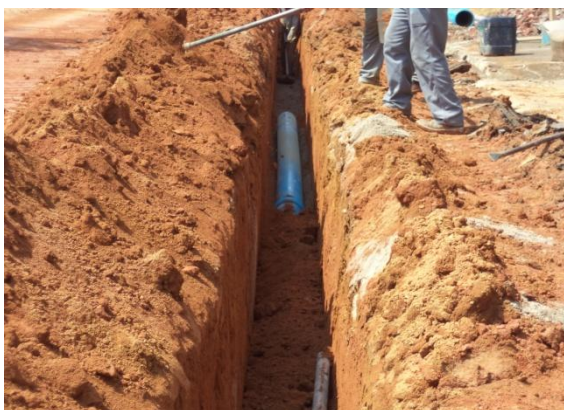


Foto 01: assentamento da rede de 200mm FoFo e rede 50mm de PVC – PBA.



Foto 03: atividades de compactação com material base para recomposição de pavimento.



Foto 02: assentamento de rede de 50mm de PVC – PBA.
